CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

N. ord.	Fase	Tavola	Attività	Durata in mesi
1	1		Formazione aree logistiche di cantiere	1
2) SISTEMA DI ADDUZIONE AI SERBATOI				12
2	2.1	Adduttore Voltano - Adduttore Itria - Adduttore Forche - Adduttore San Calogero - Adduttore San Leone	Scavi - Posa Tubazioni - Ricolmi	10
3	2.2		Opere d'arte e pozzetti	9
4	2.3		Apparecchiature idrauliche	6
5	2.4		Apparecchiature elettroniche (automazione)	4
6	2.5		Ripristini stradali	9
7	2.6		Interventi di rispirstino manufatti esistenti	5
8	2.7		Indagini archeologiche Adduttore per serb. San Leone	3
9	2.8		Prove idrauliche e collaudi	2
3) RETE SERVITA DAL SERBATOIO POGGIO MUSCELLO				16
10	3.1		Scavi - Posa Tubazioni - Ricolmi	10
11	3.2		Pozzetti ed opere d'arte	9
12	3.3		Apparecchiature idrauliche	9
13	3.4		Apparecchiature elettroniche (automazione)	9
14	3.5		Ripristini stradali	12
15	3.6		Interventi sul serbatoio Cozzo Mosè	2
16	3.7		Interventi sul serbatoio Poggio Muscello	1
17	3.8		Prove idrauliche e collaudi	2
4) RETE SERVITA DAL SERBATOIO ITRIA				12
18	4.1		Indagini interferenze ipogei	4
19	4.2		Scavi - Posa Tubazioni - Ricolmi	9
20	4.3		Pozzetti ed opere d'arte	8
21	4.4		Apparecchiature idrauliche	8
22	4.5		Apparecchiature elettroniche (automazione)	5
23	4.6		Ripristini stradali	9
24	4.7		Prove idrauliche e collaudi	2
5) RETE SERVITA DAL SERBATOIO RUPE ATENEA				18
25	5.1		Scavi - Posa Tubazioni - Ricolmi	16
26	5.2		Pozzetti ed opere d'arte	14
27	5.3		Apparecchiature idrauliche	11
28	5.4		Apparecchiature elettroniche (automazione)	10
29	5.5		Ripristini stradali	13
30	5.6		Interventi sul serbatoio Rupe Atenea	1
31	5.7		Prove idrauliche e collaudi	2
6) RETE SERVITA DAL SERBATOIO VILLASETA				10
32	6.1		Scavi - Posa Tubazioni - Ricolmi	8
33	6.2		Pozzetti ed opere d'arte	6
34	6.3		Apparecchiature idrauliche	3
35	6.4		Apparecchiature elettroniche (automazione)	4
36	6.5		Ripristini stradali	7
37	6.6		Interventi sul serbatoio Villaseta	2
38	6.7		Prove idrauliche e collaudi	1
7) RETE SERVITA DAL SERBATOIO VIALE				10
39	7.1		Scavi - Posa Tubazioni - Ricolmi	9
40	7.2		Pozzetti ed opere d'arte	7
41	7.3		Apparecchiature idrauliche	6
42	7.4		Apparecchiature elettroniche (automazione)	6
43	7.5		Ripristini stradali	8
44	7.6		Interventi sul serbatoio Viale	1
45	7.7		Prove idrauliche e collaudi	1
8) RETE SERVITA DAL SERBATOIO SAN LEONE				10
39	8.1		Scavi - Posa Tubazioni - Ricolmi	7
40	8.2		Pozzetti ed opere d'arte	4
41	8.3		Apparecchiature idrauliche	4
42	8.4		Apparecchiature elettroniche (automazione)	4
43	8.5		Ripristini stradali	7
44	8.6		Interventi sul serbatoio San Leone	3
45	8.7		Prove idrauliche e collaudi	1
9) RETE SERVITA DAL SERBATOIO GIARDINI				10
46	9.1		Scavi - Posa Tubazioni - Ricolmi	9
47	9.2		Pozzetti ed opere d'arte	7
48	9.3		Apparecchiature idrauliche	6
49	9.4		Apparecchiature elettroniche (automazione)	6
50	9.5		Ripristini stradali	8
51	9.6		Interventi sul serbatoio Giardini	1
52	9.7		Prove idrauliche e collaudi	1

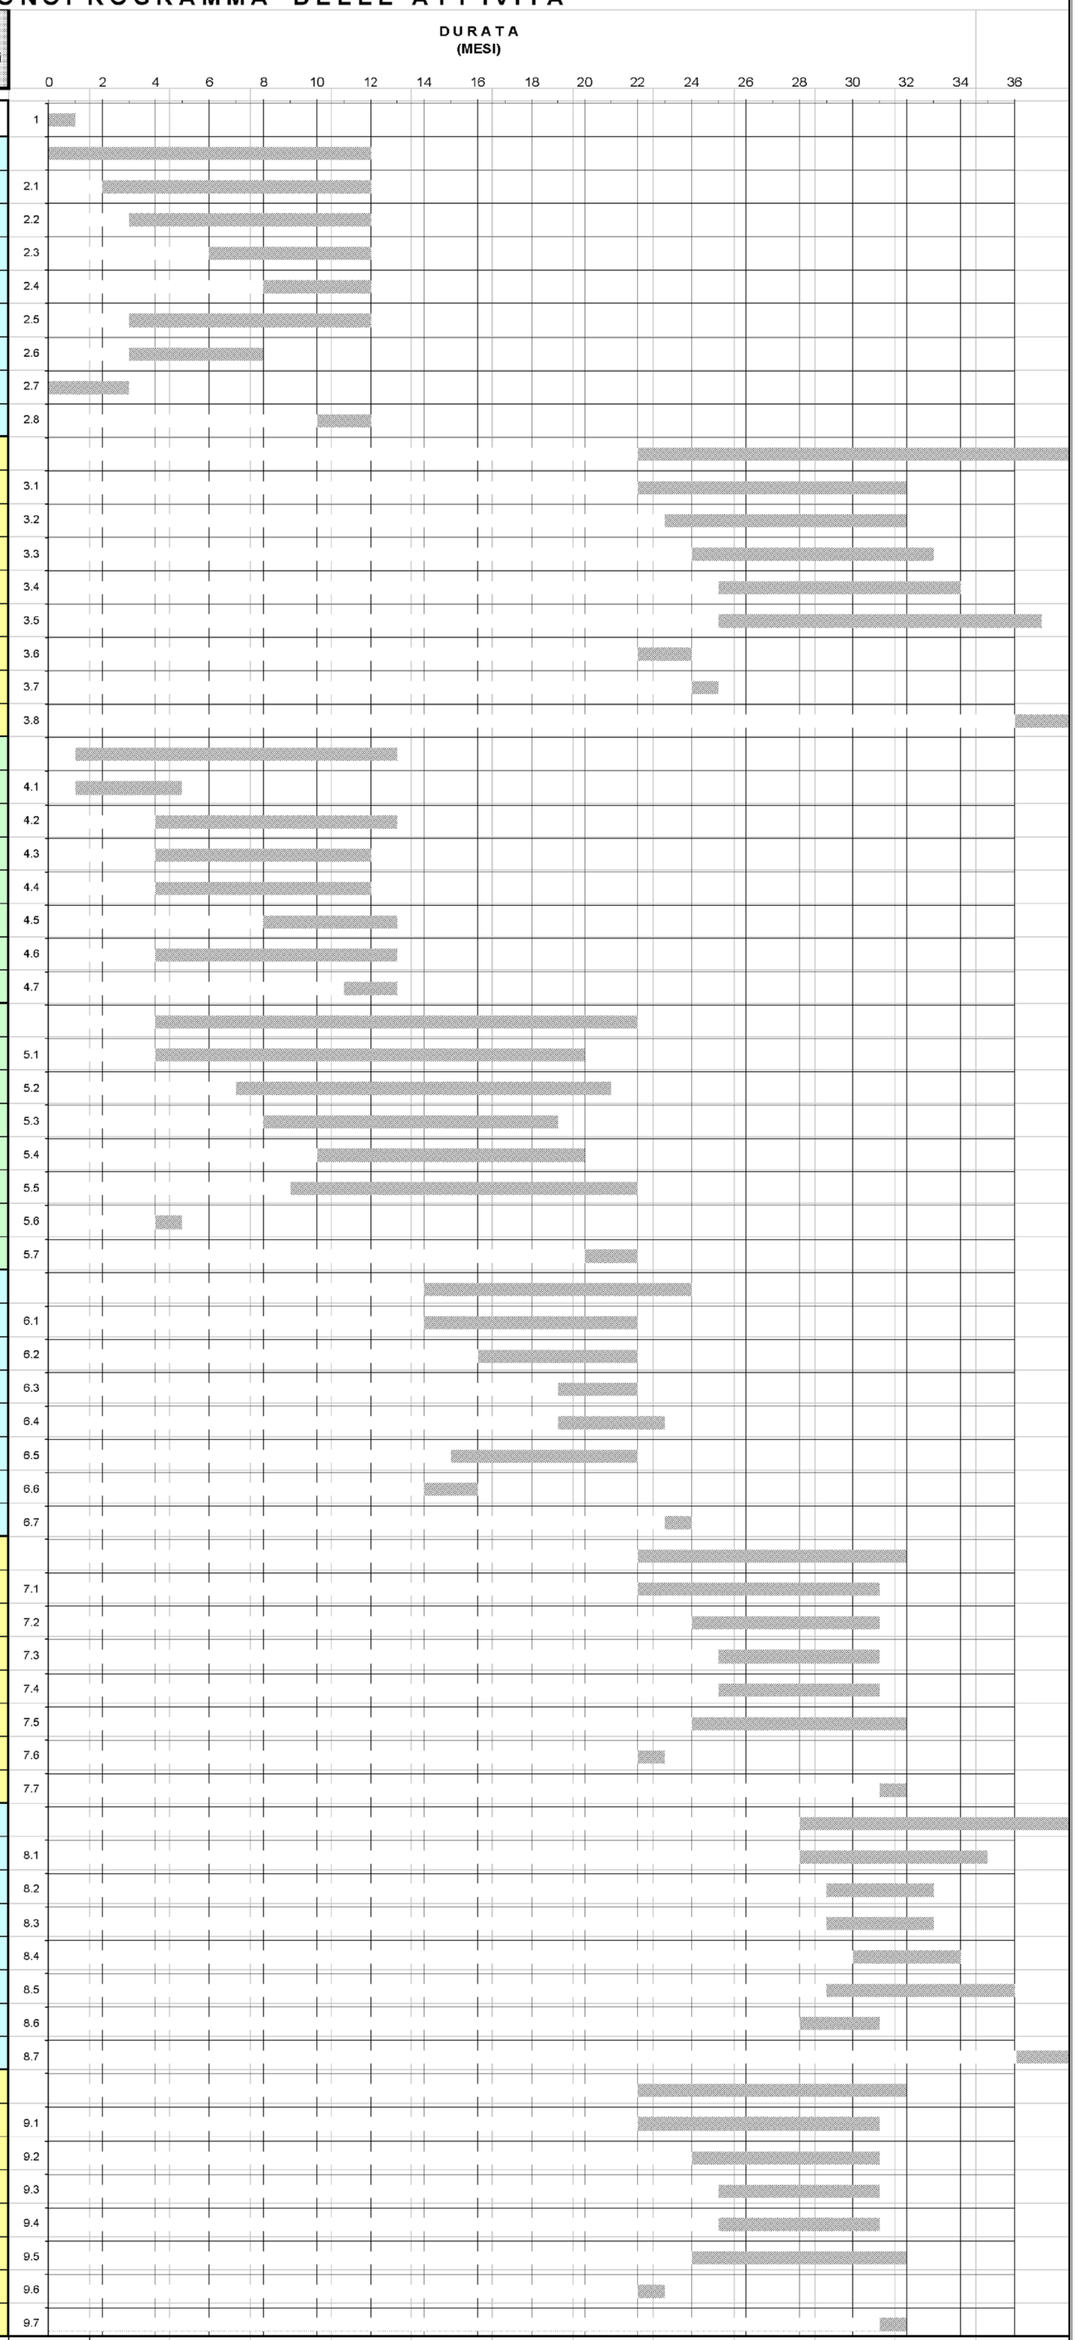

Tempo esecuzione lavori	Inizio lavori
1080	0
giorni naturali consecutivi	

REGIONE SICILIANA

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE IDRICO DI AGRIGENTO

GESTORE DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI AGRIGENTO

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

.....

PROGETTO ESECUTIVO

Opere di ristrutturazione ed automazione per ottimizzazione rete idrica Comune di Agrigento

ALLEGATO N°

19.9

TITOLO ELABORATO

ELABORATI ECONOMICI

Cronoprogramma dei lavori

Nome file: 19.9 cronoprogramma.dwg **Scala:**

Visti ed approvazioni:

CUP:

SERVIZI INGEGNERIA delta ingegneria

Delta Ingegneria s.r.l.

I DIRETTORI TECNICI:
Ing. Maurizio Carlino
Ing. Nicola D'Alessandro

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento — Sez. A — N. A 628 — Dott. Ing. Maurizio Carlino

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento — Sez. A — N. A 995 — Dott. Ing. Nicola D'Alessandro

Arch. Carmelo Carlino
Ing. Domenico D'Alessandro
Ing. Alfonso Collura
Ing. Gerlando Vaccaro
Geol. Massimo Carlino
Ing. Alessandro Dinolfo
Ing. Sonia Vitellaro

REV.	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO	CONTROLLATO	APPROVATO
B					
A					
